



SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

No. recibo: ACR/105/2017/10/IOP/24112017

C. LIC. LUIS GERARDO PEREZ PEREZ
 Presidente Municipal de
 Medellín de Bravo
 PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

Información recepcionada: INFORMACION DE OBRA PUBLICA


Periodo: OCTUBRE

Fecha de recepción: 24/11/2017

Fecha de vencimiento del 25/11/2017
plazo de entrega:

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO			COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL	WORD		FECHA	HORA
Oficio de Remisión de los Estados de Obra	✓	NA	NA		24/11/2017	13:11:58
Acta de sesión de cabildo de autorización de los Estados de Obra	✓	NA	NA		24/11/2017	14:08:57
Relación y total de Obras	✓	NA	NA		24/11/2017	13:12:10
Reporte Fotográfico de Avance Mensual de Obra (Formato 9)	✓	NA	NA		24/11/2017	13:12:43
Estado Mensual de Obra por Contrato (Formato 11)	✓	NA	NA		24/11/2017	13:13:19

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes; se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



Medellín de Bravo, Ver; a 15 de Noviembre de 2017

DEPENDENCIA: D.D.U.O.P

No. OFICIO: 0889/17

A S U N T O: Entrega de Reportes Programáticos
De Obras Públicas del mes de **Octubre**.

Dip. Lic. María Elisa Manterola Sainz
Presidente de la Mesa Directiva
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz.
Presente.

At'n. Lic. Cuauhtémoc Pola Estrada
Secretario de Fiscalización

Por medio de la presente remito a usted los Reportes correspondientes **al mes de Octubre de 2017**, y en conformidad con el artículo 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos: 25, Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos: 270, Fracciones: XI y para dar cumplimiento al mismo, el informe ejecutivo de la supervisión responsable de obra (FORMATO 09), el informe mensual de obra por contrato (FORMATO 11), correspondientes a los recursos del **FISMDF , FORTAMUNDF e HIDROCARBUROS** Del presente ejercicio fiscal 2017.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando de Usted.

Atentamente


Lic. Luis Gerardo Pérez Pérez
Presidente Municipal Constitucional



C.c.p. Archivo.



Anexo al oficio No. EMO/2017/MEDELLÍN DE BRAVO/27644

Numero Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2017301050001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y LAS MARIPOSAS, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2643X EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR, MUNICIPIO DE MEDELLIN DE	Sí	No	Sí	No
2017301050004	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOC. IXCOALCO, MPIO. DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE: 330DJN0327E, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050006	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 30EJN1280G, DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050007	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE: 30DPR3886Z, DE LA LOC. PLAYA DE VACAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050008	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 30DPR0299P, DE LA LOCALIDAD DE IXCOALCO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No

SELLO DIGITAL:

vBZK03+QUA4VHBDyIUXvMbKTclknw84TbnsVVRX5VFjlf0j16RDvyn9oPTIf/pozSCUggvajmzXeeSWCblq1lIu6CihEhVflv1g2alGcs7m0Ej0mZP3jTDIfDhygq7sISPcrl9iSpu2oANzMjKHvHqJ5mRchEaDeloQmsRK9zl=



Anexo al oficio No. EMO/2017/MEDELLÍN DE BRAVO/27644

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2017301050009	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CON CLAVE: 30DPR0310V, DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050010	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 30DPR0435C, DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050015	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO CON CLAVE:30DPR0307H, DE LA LOC. PASO DEL TORO, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE	Sí	No	Sí	No
2017301050016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE :30DTV 0194U EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050011	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM. MTRO. RAUL CONTRERAS FERTEO CON CLAVE: 30EPR3966K, DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CON CLAVE: 30EPR3159I EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 30EJN0144W, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No

SELLO DIGITAL:

vBZK03+QUA4VHBDyLUXvMbKTclknw84TbnsVWRX5YfjflF0j16RDvyn9oPTIf/pozSCUgvgajmzXeeSWCbIq1llu6CihEhVfLv1g2alGcs7m0Ej0mZP3jTDIfDhygq7sISpCrL9iSpu2oANzMjKHvHqJ5mRchEaDeloQmsRK9Zl=



Anexo al oficio No. EMO/2017/MEDELLÍN DE BRAVO/27644

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2017301050023	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE: 30EPR1361H EN EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDADES VARIAS (MEDELLIN, LOS ROBLES, EL TEJAR Y PASO DEL TORO) DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050025	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA XICOTENCATL, CON CLAVE 30EPR3630Z, EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050026	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELSSA ARCELUS DE ZAPATA CON CLAVE: 30DJN0011G DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050027	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE: 30DJN1568J DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050028	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑO AMADO NERVO CON CLAVE: 30DJN2637W EN LA LOCALIDAD DE MOZAMBIQUE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050029	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CÁNDIDO AGUILAR, CON CLAVE: 30DJN2686, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050030	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA HEROICA VERACRUZ, CON CLAVE: 30DTV1707J, EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050031	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA EMILINO ZAPATA, CON CLAVE: 30EPR1366C, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No

SELLO DIGITAL:

vbZK03+QUA4VH8DylUXvMbkTclkwN84TbnsVWRX5YfjF0jGRIvnp0R1f/por2CLeayimzXeeSWCblq1llu6ChFhVflv1g2alGcs7m0Ej0mZP3jTDIfDhygq7siSPorL9ISpu2oANzMjKHvHqj5mRchEaDeLoQmsRK9zi=



Anexo al oficio No. EMO/2017/MEDELLÍN DE BRAVO/27645

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2017301050216	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE VACA	Sí	No	Sí	No
2017301050217	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO DEL TEJAR DE SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA	Sí	No	Sí	No
2017301050218	CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIA	Sí	No	Sí	No
2017301050220	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO	Sí	No	Sí	No
2017301050221	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA EL TEJAR-VERACRUZ EN EL TRAMO ACCESO A DOS BOCAS-ACCESO SORIANA, MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050222	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MEDELLIN DE BRAVO, VER.	Sí	No	Sí	No
2017301050223	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VIEJO EL TEJAR-RANCHO DEL PADRE, DEL KM 0+627 AL KM 1+490 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

jihndluqh3fffjzV1t9b+WHweyxSRfClHySYfajtdLk1g7cfFvWfjV7wp+PUseCF6YZWUZdZLfdctgDB4/tLncqqlvK9GBj9OnVLveC6OphA90R+vbNH0+wsT7RQQbCKxl3R/ZM17ZRwz4ZNxnvGryWyksqyuGhsM79ryeBWJ3tM=



AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO 2017

No.	NÚMERO	OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EXPEDIENTE	
									U	B
1	2017301050001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	LOS ROBLES	\$821,731.22	\$0.00	100.00	100.00	FISMDF		
2	2017301050002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y LAS MARIPOSAS, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	MEDELLÍN	\$402,809.42	\$0.00	100.00	100.00	FISMDF		
3	2017301050003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2643X EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR, MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	EL TEJAR	\$0.00	\$428,946.27	100.00	0.00	FISMDF		
4	2017301050004	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOC. IXCOALCO, MPIO. DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	IXCOALCO	\$755,621.85	\$191,914.00	100.00	79.74	FISMDF		
5	2017301050005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE: 330DJN0327E, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	EL TEJAR	\$402,415.54	\$96,351.83	100.00	80.68	FISMDF		
6	2017301050006	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 30EJN1280G, DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	PALMIRA	\$230,684.05	\$115,376.79	100.00	66.66	FISMDF		
7	2017301050007	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE: 30DPR3886Z, DE LA LOC. PLAYA DE VACAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	PLAYA DE VACAS	\$0.00	\$498,560.00	100.00	0.00	FISMDF		
8	2017301050008	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 30DPR0299P, DE LA LOCALIDAD DE IXCOALCO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	IXCOALCO	\$149,137.31	\$347,987.07	100.00	30.00	FISMDF		
9	2017301050009	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CON CLAVE: 30DPR0310V, DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.	LOS ROBLES	\$149,978.20	\$349,949.13	100.00	30.00	FISMDF		
10	2017301050010	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 30DPR0435C, DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	PASO DEL TORO	\$149,997.26	\$349,993.60	100.00	30.00	FISMDF		
11	2017301050011	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM. MTRO. RAUL CONTRERAS FERRO CON CLAVE: 30EPR3966K, DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	NAMIEMTO ARBOLEDAS SAN	\$325,250.92	\$173,415.69	100.00	65.22	FISMDF		

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO 2017

No.	NÚMERO	OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EXPEDIENTE	
									U	B
12	2017301050015	CONSTRUCCUION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO CON CLAVE:30DPR0307H, DE LA LOC. PASO DEL TORO, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	PASO DEL TORO	\$1,088,869.73	\$79,849.03	100.00	93.16	FIS MDF		
13	2017301050016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE :30DTV 0194U EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	MEDELLIN	\$429,532.34	\$0.00	100.00	100.00	FIS MDF		
14	2017301050019	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVISION DE OBRAS)	MEDELLIN	\$270,225.76	\$145,506.17	65.00	65.00	FIS MDF		
15	2017301050020	DEUDA PUBLICA-OBLIGACIONES (HASTA 25% CREDITO BANOBRAS FAIS)	MEDELLIN	\$3,815,919.00	\$847,982.00	81.81	81.81	FIS MDF		
16	2017301050021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CON CLAVE: 30EPR3159I EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	MEDELLIN	\$0.00	\$587,679.95	48.00	0.00	FIS MDF		
17	2017301050022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 30EJN0144W, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	EL TEJAR	\$127,306.11	\$297,047.58	100.00	30.00	FIS MDF		
18	2017301050023	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE: 30EPR1361H EN EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	EL TEJAR	\$176,162.03	\$411,044.75	100.00	30.00	FIS MDF		
19	2017301050024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDADES VARIAS (MEDELLIN, LOS ROBLES, EL TEJAR Y PASO DEL TORO) DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	MEDELLIN	\$0.00	\$931,173.42	0.00	0.00	FIS MDF		
20	2017301050025	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA XICOTENCATL, CON CLAVE 30EPR3630Z, EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	PASO DEL TORO	\$149,592.71	\$349,049.65	100.00	30.00	FIS MDF		
21	2017301050026	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELSSA ARCELUS DE ZAPATA CON CLAVE: 30DJN0011G DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	LOS ROBLES	\$0.00	\$499,339.88	65.00	0.00	FIS MDF		
22	2017301050027	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE: 30DJN1568J DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	LAGUNA Y MONTE DEL CAST	\$374,046.73	\$124,116.73	100.00	75.08	FIS MDF		
23	2017301050028	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE: 30DJN2637W EN LA LOCALIDAD DE MOZAMBIQUE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	MOZAMBIQUE	\$248,514.38	\$248,514.38	98.00	50.00	FIS MDF		
24	2017301050029	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CÁNDIDO AGUILAR, CON CLAVE: 30DJN2686, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	RANCHO DEL PADRE	\$0.00	\$421,169.33	70.00	0.00	FIS MDF		

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO 2017

No.	NÚMERO	OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EXPEDIENTE	
									U	B
25	2017301050030	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA HEROICA VERACRUZ, CON CLAVE: 30DTV1707J, EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	PRIMERO DE LA PALMA	\$143,683.87	\$335,262.37	98.00	30.00	FISMDF		
26	2017301050031	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA EMILINO ZAPATA, CON CLAVE: 30EPR1366C, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	LOMAS DEL PORVENIR	\$239,961.97	\$239,961.98	96.00	50.00	FISMDF		
TOTAL				\$10,451,440.40	\$8,070,191.60					

INFORMACIÓN AL: 25/11/2017

RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN:

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO 2017

No.	NÚMERO	OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EXPEDIENTE	
									U	B
1	2017301050201	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (PASIVOS)	MEDELLÍN	\$10,273,436.74	\$1,452,750.67	87.61	87.61	FORTAMUNDF		
2	2017301050202	PAGO DE AUDITORIA 2017	MEDELLÍN	\$360,000.00	\$1,040,000.00	25.71	25.71	FORTAMUNDF		
3	2017301050203	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEDELLÍN	\$1,090,000.00	\$1,350,449.51	44.66	44.66	FORTAMUNDF		
4	2017301050204	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE	MEDELLÍN	\$2,197,204.94	\$0.02	100.00	100.00	FORTAMUNDF		
5	2017301050205	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	MEDELLÍN	\$7,503,050.40	\$3,044,114.82	71.13	71.13	FORTAMUNDF		
6	2017301050206	SEGUROS Y TENENCIAS	MEDELLÍN	\$198,478.33	\$101,521.67	66.15	66.15	FORTAMUNDF		
7	2017301050207	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	MEDELLÍN	\$1,397,709.37	\$202,290.63	87.35	87.35	FORTAMUNDF		
8	2017301050208	SERVICIO DE INFORMATICA, PAQUETERIA Y UTILERIA (SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN ARCHIVO)	MEDELLÍN	\$300,000.00	\$300,000.00	50.00	50.00	FORTAMUNDF		
9	2017301050209	PROVISIONES, DESPENSAS, MANTAS ETC. (PROTECCIÓN CIVIL)	MEDELLÍN	\$498,425.22	\$1,574.78	99.68	99.68	FORTAMUNDF		
10	2017301050210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	MEDELLÍN	\$859,560.00	\$351,940.04	70.95	70.95	FORTAMUNDF		
11	2017301050211	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO	MEDELLÍN	\$36,923.59	\$13,076.41	73.84	73.84	FORTAMUNDF		
12	2017301050213	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	MEDELLÍN	\$749,797.32	\$750,202.68	49.98	49.98	FORTAMUNDF		
13	2017301050214	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	MEDELLÍN	\$1,742,175.18	\$830,926.90	67.70	67.70	FORTAMUNDF		
14	2017301050215	ENTREGA RECEPCION	MEDELLÍN	\$0.00	\$400,000.00	0.00	0.00	FORTAMUNDF		
15	2017301050216	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE VACA	PLAYA DE VACAS	\$482,359.80	\$47,526.05	100.00	91.03	FORTAMUNDF		
16	2017301050217	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CAMINO EL TEJAR AL FRACC. ARBOLEDAS SAN MIGUEL HACIA LA ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA EN LA LOC. EL TEJAR, MPIO. MEDELLIN DE BRAVO, VER. (SEGUNDA ETAPA)	EL TEJAR	\$668,301.96	\$0.00	100.00	100.00	FORTAMUNDF		
17	2017301050218	CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIA (SEGUNDA ETAPA)	NAMIENTO ARBOLEDAS SAN	\$1,299,990.64	\$0.00	100.00	100.00	FORTAMUNDF		
18	2017301050219	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LOS CARRILES (PRIMERA ETAPA).	EL TEJAR	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00	0.00	FORTAMUNDF		
19	2017301050220	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO	E DE NOVIEMBRE DE MEDE	\$499,374.95	\$0.00	100.00	100.00	FORTAMUNDF		
20	2017301050221	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA EL TEJAR, VERACRUZ EN EL TRAMO ACCESO A DOS BOCAS- ACCESO SORIANA, MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	DOS BOCAS	\$240,047.28	\$0.00	100.00	100.00	FORTAMUNDF		
21	2017301050222	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MEDELLIN DE BRAVO, VER.	MEDELLÍN	\$61,323.03	\$143,087.07	100.00	30.00	FORTAMUNDF		
TOTAL				\$30,458,158.75	\$11,029,461.25					

INFORMACIÓN AL: 25/11/2017

RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN:

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



FISMDF OCTUBRE 2017



Medellin Por Ti En Accion

Nicolás Bravo No. 60 C.P. 94270 Col. Centro Tel: 01 (285) 956 50 00
medellinenaccion@hotmail.com
R.F.C. MMB640114 IE6



@Medellin2014



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2017/MEDELLÍN DE BRAVO/27644

C. LUIS GERARDO PEREZ PEREZ
MEDELLÍN DE BRAVO
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/11/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Santos Vega Romero
Observaciones:	

Cadena original:

vBZK03+QUA4VHBDyIUXvMbKTdkwn84TbnsVWRX5YFjflF0j16RDvyn9oPTIf/
pozSCUggvajmzXeeSWCblq1llu6CihEhVfLv1g2alGcs7m0Ej0mZP3jTDIfDhygq7sISPcrL9iSpu2oANzMjKHv
HqJ5mRchEaDeloQmsRK9zl=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA****DATOS GENERALES**

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** LOS ROBLES **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050001.00 **Periodo:** OCTUBRE **Número de estimación:** ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. **Fuente de financiamiento:** SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 21/11/2017

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CON BRAZO DE 1.20 M

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED

Observaciones:

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION: 20/11/2017
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: LOS ROBLES	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050001	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> X
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA <input checked="" type="checkbox"/> X	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/> X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
LATITUD: 18.973080000	LONGITUD: -96.119766000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			310	\$821,731.22	\$246,519.36	\$3,541.94	\$0.00	\$571,669.92
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$821,731.22	\$246,519.36	\$3,541.94	\$0.00	\$571,669.92

MONTO AUTORIZADO:	\$822,500.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$822,500.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-006/2017	FECHA:	23/06/2017
CONTRATISTA:	IDALID FLORES MONCADA		
MONTO CONTRATADO:	\$821,731.22	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO 04/06/2017	05/06/2017	
	TÉRMINO 11/08/2017	11/08/2017	
	DÍAS 49	48	
ANTICIPO:	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X NO APLICA <input type="checkbox"/>	MONTO: \$246,519.36	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	08/08/2017	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$575,211.86	22/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$821,731.00	29/09/2017
FINIQUITO:	\$821,731.00	29/09/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	14/08/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	12	70	18	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	12	70	18	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$246,519.36	\$82,173.12	\$82,173.12
AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS	LIBERTY FIANZAS	LIBERTY FIANZAS
NO. DE FIANZA:	1858092-0000	1858093-0000	1866016-0000
FECHA:	23/06/2017	23/06/2017	14/08/2017
	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$821,731.22	C/IVA	

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANJE EFREN CORNAZZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL LUIS HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	MEDELLÍN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050002.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y LAS MARIPOSAS, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO,VER.			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	21/11/2017

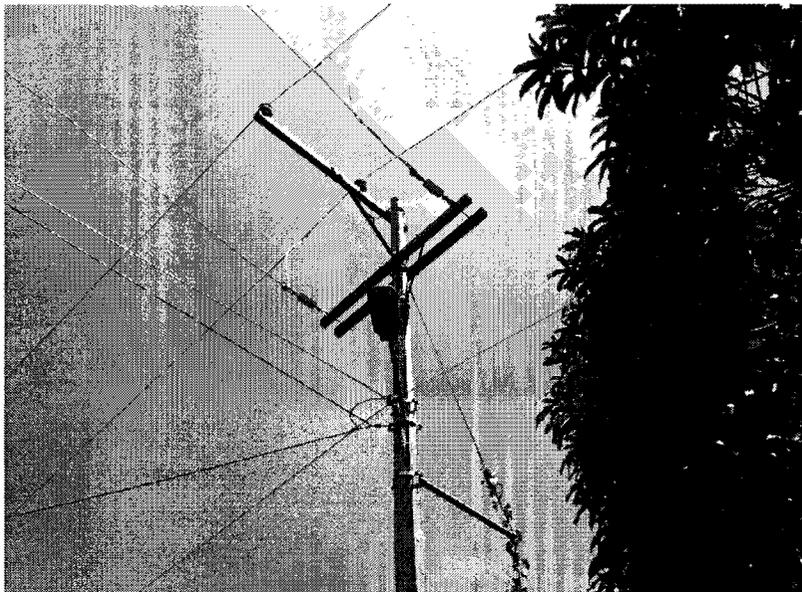

FOTO

Concepto de obra ejecutado: BRAZO GALVANIZADO DE 1.20 MT. DE LONGITUD , ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO 2BS .FOTOCELDA DUAL.

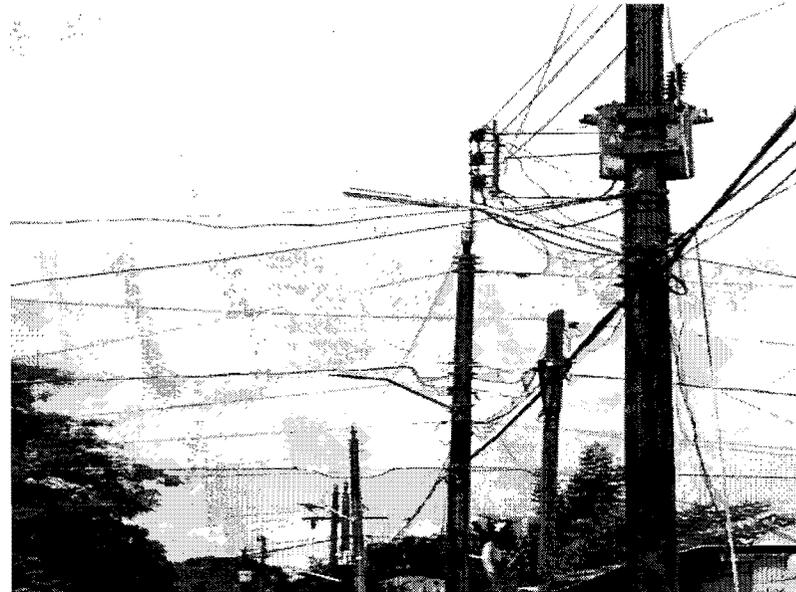

FOTO

Concepto de obra ejecutado: CABLE THW CALIBRE 12, MANO DE OBRA , MATERIAL HERRAMIENTA , EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/11/2017
MES QUE SE REPORTEA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO		LOCALIDAD: MEDELLIN		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS Y LAS MARIPOSAS, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2017301050002			

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	N/A	MUY ALTO	ALTO
	URBANA	AGEB:		MEDIO	BAJO
	X			MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	DIRECTA	INDIRECTA
				COMPLEMENTARIA	X
CÓORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	
LATITUD	19.053775000	LONGITUD	-96.166106000	SI	X
				NO	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			296	\$402,809.42	#####	\$1,736.25	\$0.00	\$280,230.34
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$402,809.42	#####	\$1,736.25	\$0.00	\$280,230.34

MONTO AUTORIZADO:	\$402,809.42	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$403,025.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$281,966.59	13/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$402,809.00	29/09/2017
FINIQUITO:	\$402,809.00	29/09/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	11/08/2017

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	25	65	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	10	25	65	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-007/2017	FECHA:	24/06/2017
CONTRATISTA:	IDALID FLORES MONCADA		
MONTO CONTRATADO:	\$402,809.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	26/06/2017	26/06/2017
	TÉRMINO	08/08/2017	08/08/2017
	DÍAS	44	44
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$120,842.83	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	03/08/2017	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$120,842.83	\$40,280.94	\$40,280.94
AFIANZADORA:	Liberty Fianzas	Liberty Fianzas	LIBERTY FIANZAS
No. DE FIANZA:	1858089-0000	1858090-0000	18660115-0000
FECHA:	26/06/2017	10/09/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$402,809.00		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORMAZZANI REYES ING. ANGEL JUELHER HERNANDEZ REYES
 DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	EL TEJAR	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050003.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2643X EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR, MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	21/11/2017

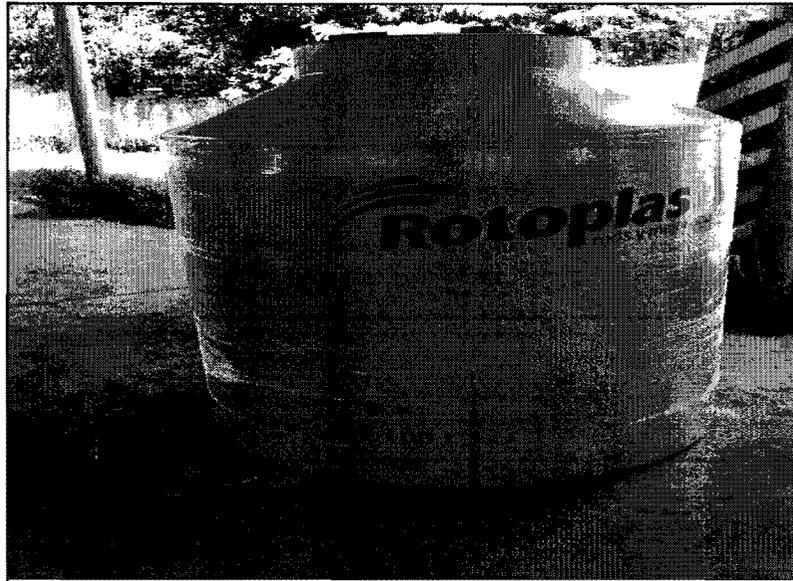

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS. CON TAPA ROTOPLAS. INCLUYE ELEVACION COLOCACION, FIJACION ARMADO DE VALVULAS Y CONEXIÓN DE TUBERIAS.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC CATO O SIMILAR CON TAPA Y TANQUE PARA NIÑOS ESPECIFICACIONES VIGENTES COLOR BLANCO INC. HERRAJES.

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	IXCOALCO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050004.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 PARCIAL
Descripción:	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOC. IXCOALCO, MPIO. DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.			Fuente de financiamiento:	MUCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

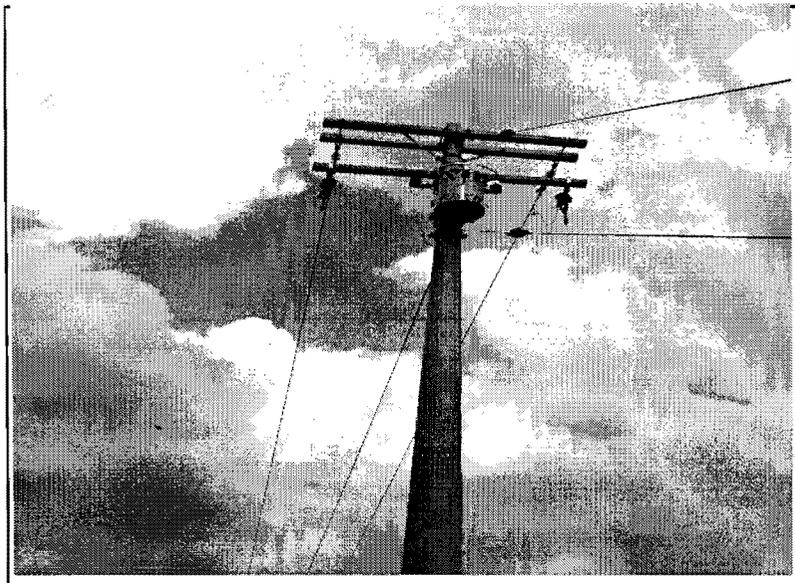

FOTO

Concepto de obra ejecutado: POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 7-500. PARADO CON EQUIPO HIDRAULICO.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 7-500 INCLUYE ACARREO,EXCAVACION DE CEPA , PARADO CON EQUIPO HIDRAULICO,MATERIALES,MANO DE OBRA.

Observaciones:

[Empty box for observations]

ING ANGEL URIEL FERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO		LOCALIDAD: IXCOALCO		DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2017301050004		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOC. IXCOALCO, MPIO. DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA:	RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	<input type="checkbox"/>
		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA COMPLEMENTARIA	
LATITUD	19.046314000	LONGITUD	-96.177450000
		PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

AVANCE DE 100.0% FÍSICO, TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 1 PAR	\$0.00			662	\$755,621.85	\$0.00	\$3,256.99	\$0.00	\$752,364.86
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$755,621.85	\$0.00	\$3,256.99	\$0.00	\$752,364.86

MONTO AUTORIZADO:	\$947,535.85	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$948,750.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	C.F.E	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	C.F.E	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-011/2017	FECHA:	05/07/2017
CONTRATISTA:	CVER S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$947,535.85	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		08/07/2017	08/07/2017
	TÉRMINO		
		21/08/2017	21/08/2017
	DÍAS	45	45
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO:		
	FECHA DE PAGO:	PORCENTAJE:	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$755,621.85	02/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$755,621.00	30/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	28/08/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$94,535.85	
AFIANZADORA:		LIBERTY FIANZAS	
No. DE FIANZA:		1866556-0000	
FECHA:		08/07/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA
			INICIAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$947,535.85	C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL LURIEL PERDANDEZ REYES
SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	<u>MEDELLÍN DE BRAVO</u>	Localidad:	<u>EL TEJAR</u>	Ejercicio fiscal:	<u>EJERCICIO 2017</u>
No. de obra:	<u>2017301050005.00</u>	Periodo:	<u>OCTUBRE</u>	Número de estimación:	<u>ESTIMACION 2 Y FINIQUITO</u>
Descripción:	<u>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE: 330DJN0327E, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJAR DEL</u>			Fuente de financiamiento:	<u>OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS</u>
				Fecha de revisión:	<u>22/11/2017</u>

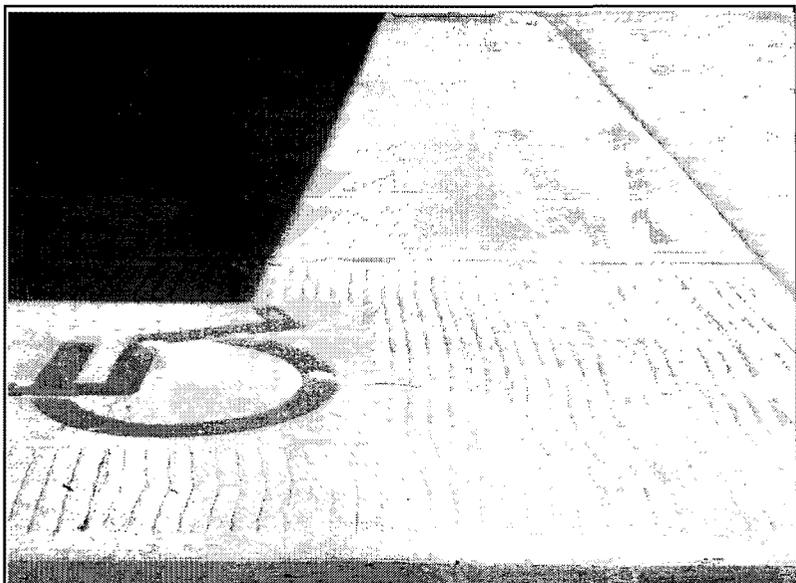

FOTO

Concepto de obra ejecutado: HECHURA DE RAMPA DE CONCRETO PARA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES .



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN VENTANAS A BASE DE CUADRADOS DE 1/2" A CADA 12 CMS. CON MARCO DE ANGULO DE 1/4 X 1 1/2 "

Observaciones:



 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: EL TEJAR	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NINOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE: 330DJN0327E, DE LA LOCALIDAD DE EL TEJAR DEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050005	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:	PROYECTO ESPECIAL: SI X NO
LATITUD: 19.072606000	LONGITUD: -96.167910000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ANEXO-COMEDOR ESCOLAR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FÍSICO DE 100.0%.

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ACION 2 Y FINIC	\$0.00			A40	\$137,645.46	\$41,293.63	\$593.30	\$0.00	\$95,758.53
IMACION 1 PARC	\$0.00			A37	\$361,121.91	\$108,336.58	\$1,556.56	\$0.00	\$251,228.77
TOTALES	\$0.00	\$0.00			\$498,767.37	\$149,630.21	\$2,149.86	\$0.00	\$346,987.30

MONTO AUTORIZADO:	\$498,767.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-002/2017	FECHA:	23/05/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GUTIERREZ ALONSO S.A. I		
MONTO CONTRATADO:	\$498,767.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO 24/05/2017	24/05/2017	
	TÉRMINO 22/07/2017	22/07/2017	
	DÍAS 60	60	
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA		
	MONTO: \$149,630.00	PORCENTAJE: 30.00	
	FECHA DE PAGO:	20/06/2017	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$95,758.53	06/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$498,767.00	31/10/2017
FINIQUITO:	\$498,767.00	28/07/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	24/07/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	10	63	27	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	10	63	27	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$149,630.21 \$49,876.73 \$49,876.73
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY ACE FIANZAS MONTERREY ACE FIANZAS MONTERREY
No. DE FIANZA:	1808747 1808739 1833435
FECHA:	23/05/2017 23/05/2017 30/08/2017
	EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO INICIAL FINAL
	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$498,767.00 C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

DANTE EFREN CORNAZAN REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING ANGEL URIEL GONZALEZ REYES
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES


Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad: PALMIRA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050006.00	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 30EJN1280G, DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA, DEL MUNICIPIO		Fecha de revisión: 22/11/2017
		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

HECHURA DE TAPA DE CONCRETO ARMADO .

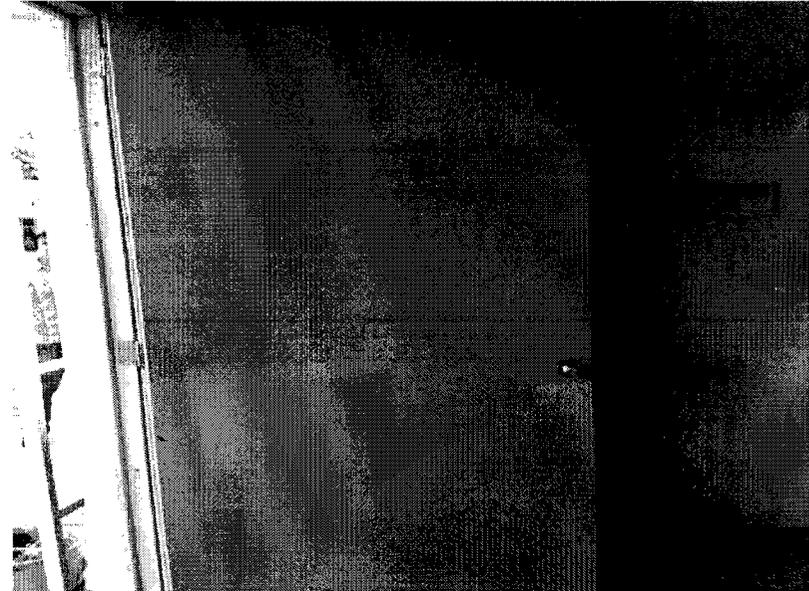

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL DE 0.90 X 2.20 MT. EN COLOR ARENA, INCLUYE MARCO METALICO, FIJO DE ALUMINIO, BISAGRAS Y JALADERAS.

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:
24/11/2017
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: PALMIRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NINOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 30EJN1280G, DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA, DEL MUNICIPIO DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050006	

ANTECEDENTES:		
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	SI	NO
TIPO DE ZONA:	RURAL	X
	URBANA	
CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	MUY ALTO	
	ALTO	
	MEDIO	
	BAJO	X
	MUY BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	DIRECTA	X
	INDIRECTA	
	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE
LATITUD 19.102365000	LONGITUD -96.256860000	SI X NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ANEXO - COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE DE 100.0 % FISICO., TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 2 Y FINIC	\$0.00			391	\$164,823.98	\$49,447.19	\$710.45	\$0.00	\$114,666.34
IMACION 1 PARC	\$0.00			385	\$181,236.86	\$54,371.06	\$781.19	\$0.00	\$126,084.61
TOTALES	\$0.00	\$0.00			\$346,060.84	#####	\$1,491.64	\$0.00	\$240,750.95

MONTO AUTORIZADO:	\$348,964.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$348,964.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO APLICA	X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO APLICA	X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$114,666.34	06/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$346,060.00	31/10/2017
FINIQUITO:	\$346,060.00	08/09/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	31/08/2017

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-005/2017	FECHA:	15/06/2017
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL DIAZ ROCHA		
MONTO CONTRATADO:	\$346,060.84	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	16/06/2017	16/06/2017
	TÉRMINO	29/08/2017	29/08/2017
	DÍAS	75	75
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$103,818.25	PORCENTAJE: 30.00	
	FECHA DE PAGO: 28/06/2017		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$103,818.25	\$34,606.08	\$34,606.08
AFIANZADORA:	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM
No. DE FIANZA:	VER024-002095	VER024-002096	VER024-002165
FECHA:	15/06/2017	15/06/2017	25/09/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$346,060.00	C/IVA	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORRAZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** PLAYA DE VACAS **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050007.00 **Periodo:** OCTUBRE **Número de estimación:**
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE: 30DPR3886Z, DE LA LOC. PLAYA DE VACAS DEL MUNICIPIO **Fuente de financiamiento:** SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 22/11/2017

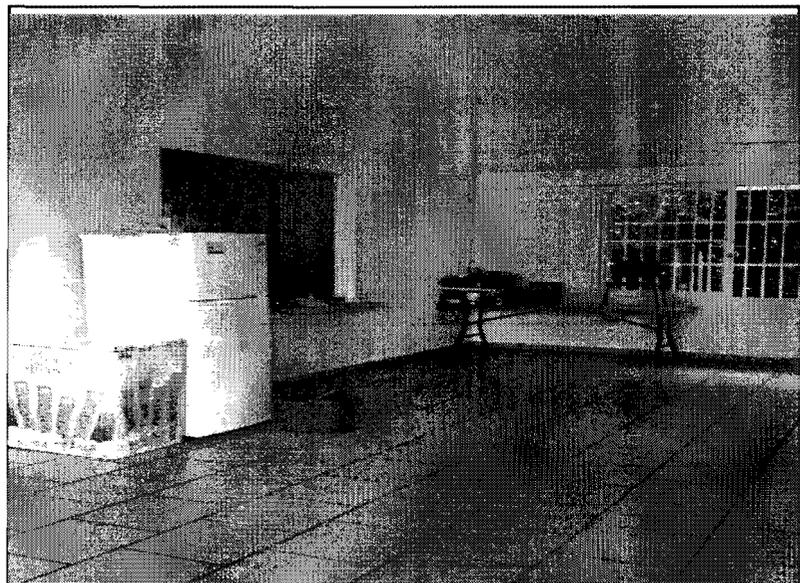

FOTO

Concepto de obra ejecutado: APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CALIDAD VIMEX EN MUROS INTERIORES Y EXTRIORES.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE INTERCERAMIC DE 33 X 33 CMS.

Observaciones:

[Empty box for observations]

 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	IXCOALCO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050008.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 PARCIAL
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 30DPR0299P, DE LA LOCALIDAD DE IXCOALCO DEL MUNICIPIO DE			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: BROCAL DE TAPA DE CONCRETO ARMADO EN EL POZO DE ABSORCION.

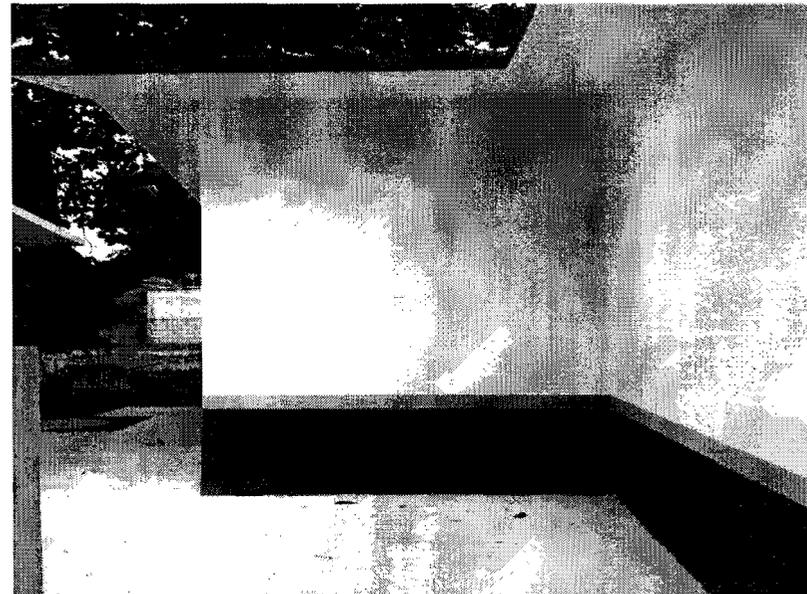

FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, CALIDAD VINIMEX Y/O SIMILAR EN MUROS INETRIORES Y EXTERIORES.

Observaciones:


 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	25/07/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO		LOCALIDAD: IXCOALCO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 30DPR0299P, DE LA LOCALIDAD DE IXCOALCO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050008		

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	CLAVE AGE: N/A	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	DIRECTA X INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI X NO
LATITUD 19.041467000	LONGITUD -96.170340000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ANEXO - COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE 100.0 % FÍSICO, TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 1 PAR	\$0.00			322	\$281,306.91	\$84,392.08	\$1,212.53	\$0.00	\$195,702.30
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$281,306.91	\$84,392.08	\$1,212.53	\$0.00	\$195,702.30

MONTO AUTORIZADO:	\$500,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$195,702.30	12/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$478,221.74	30/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	04/09/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	50	48	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	2	50	48	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-008/2017	FECHA:	28/06/2017
CONTRATISTA:	IDALID FLORES MONCADA		
MONTO CONTRATADO:	\$497,124.38		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	29/06/2017	29/06/2017
	DÍAS	28/08/2017	28/08/2017
	DÍAS	61	61
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$149,124.38	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		03/08/2017

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$149,137.31	\$49,712.44	\$49,712.44
AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS	Liberty Fianzas	LIBERTY FIANZAS
No. DE FIANZA:	1858094-0000	1858095-0000	1858095-0000
FECHA:	28/06/2017	28/06/2017	29/09/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:		\$497,124.00	C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN COBNAZZANI REYES DIRECTOR DE OBRAS
ING. ANGEL GABRIEL HERNANDEZ REYES SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	LOS ROBLES	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050009.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CON CLAVE: 30DPR0310V, DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES, DEL			Fuente de financiamiento:	MUCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO DE COLOR TERRACOTA

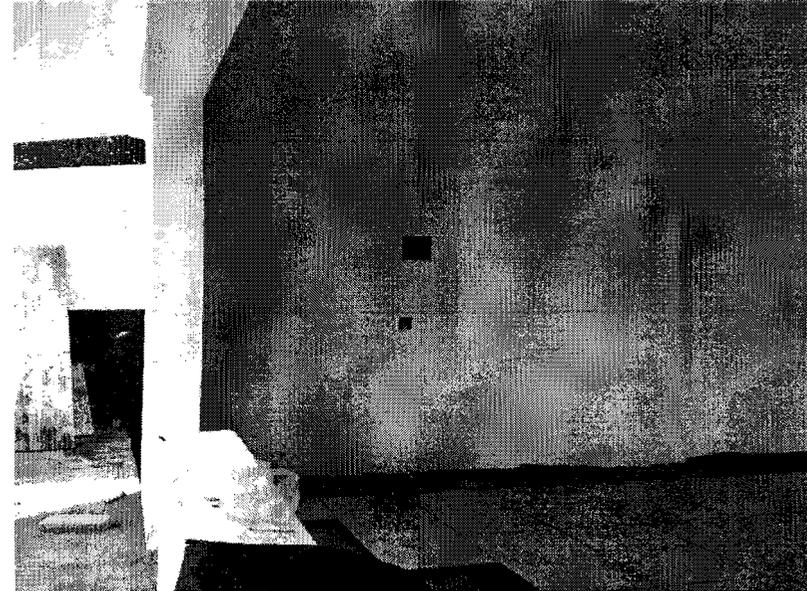

FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE INTERCERAMIC DE 33 X 33 CMS.

Observaciones:

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:
21/11/2017
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: LOS ROBLES	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CON CLAVE: 30DPR0310V, DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES, DEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050009	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:	PROYECTO ESPECIAL: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
LATITUD: 18.969956000	LONGITUD: -96.118660000
	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ANEXO - COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
OBRA TERMINADA Y OPERANDO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$499,927.33	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	X
	LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$149,978.20	04/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$149,978.00	31/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	09/10/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	15	35	50	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	15	35	50	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

NO. DE CONTRATO: MMB-DDUOP-FISMDF-012/2017	FECHA: 10/07/2017
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GUTIERREZ ALONSO S.A. C	
MONTO CONTRATADO: \$499,927.00	C/IVA
	PROGRAMADA REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 13/07/2017 13/07/2017
	TÉRMINO 05/09/2017 05/09/2017
	DÍAS 58 58
	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>
ANTICIPO:	MONTO: \$149,978.20 PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$149,978.20 \$49,992.73 \$49,992.73
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERRECE FIANZAS MONTERRECE FIANZAS MONTERRE
No. DE FIANZA:	1827433 1827430 1842830
FECHA:	10/07/2017 10/07/2017 05/10/2017
	EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZA INICIAL FINAL
	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$499,927.00 C/IVA

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZZANI REYES ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad: PASO DEL TORO	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050010.00	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: ANTICIPO
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 30DPR0435C, DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 22/11/2017

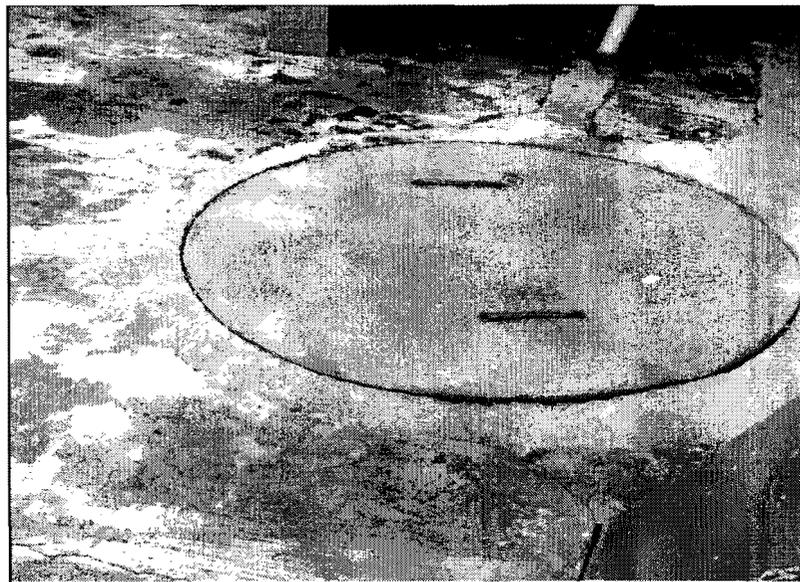

FOTO

Concepto de obra ejecutado: BROCAL DE TAPA DE CONCRETO ARMADO EN EL POZO DE ABSORCION.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: PINTURA VINILICA DE CALIDAD VINIMEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CALIDAD VINIMEX

Observaciones:

 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	IONAMIENTO ARBOLEDAS SAN F	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050011.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 PARCIAL
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM. MTRO. RAUL CONTRERAS FERTO CON CLAVE: 30EPR3966K, DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS SAN RAMON DEL			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

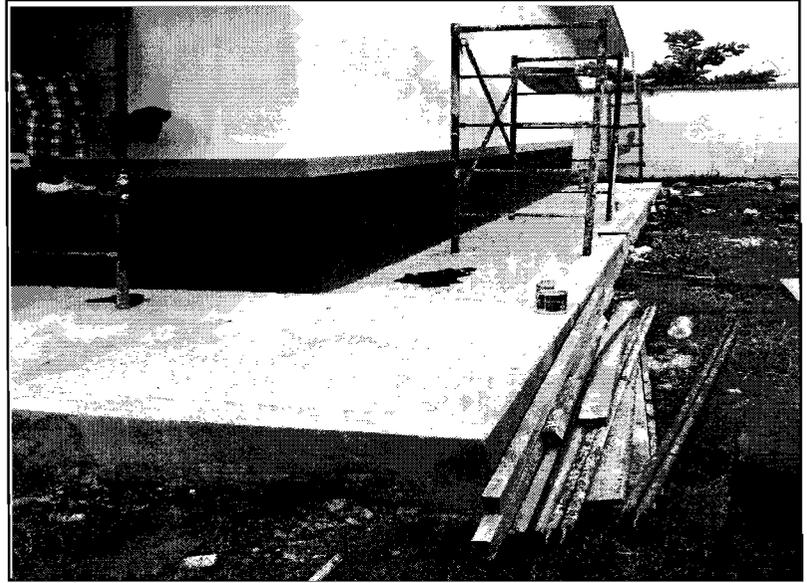

FOTO


Concepto de obra ejecutado: APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: FABRICACION DE BARRA DE CONCRETO DE 3.80 X 0.60 MT. FORRADA DE AZULEJO; INCLUYE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.85 MT.

Observaciones:



 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS SAN RAMON
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050011
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM. MTRO. RAUL CONTRERAS FERTO CON CLAVE: 30EPR3966K, DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS SAN RAMON DEL	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL <input type="checkbox"/> CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
LATITUD 19.096259000	LONGITUD -96.159658000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ANEXO - COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE DE 100% FÍSICO, TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 1 PAR	\$0.00			386	\$250,929.92	\$75,278.98	\$1,081.59	\$0.00	\$174,569.35
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$250,929.92	\$75,278.98	\$1,081.59	\$0.00	\$174,569.35

MONTO AUTORIZADO:	\$500,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE <input type="checkbox"/>	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>
	LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$175,650.94	FECHAS 02/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$325,250.92	29/07/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	04/10/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-010/2017	FECHA:	30/06/2017
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL DIAZ ROCHA		
MONTO CONTRATADO:	\$498,666.61	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO 03/07/2017	03/07/2017	
	TÉRMINO 26/09/2017	31/08/2017	
	DÍAS 86	60	
ANTICIPO:	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>		
	MONTO: \$149,599.98	PORCENTAJE: 30.00	
	FECHA DE PAGO: 18/07/2017		

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$149,599.98	\$49,866.66	\$49,866.66
AFIANZADORA:	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM
No. DE FIANZA:	VER024-002105	VER024-002106	VER024-002177
FECHA:	30/06/2017	30/06/2017	26/09/2017

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$498,666.61	C/IVA	

DANTE EFREN CORRAZANI REYES DIRECTOR DE OBRAS
ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** PASO DEL TORO **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050015.00 **Periodo:** OCTUBRE **Número de estimación:** ESTIMACION 1 PARCIAL
Descripción: CONSTRUCCUION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO CON CLAVE:30DPR0307H, DE LA LOC. PASO DEL **Fecha de revisión:** 22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: APLICACIÓN DE PRIMARIO RP-2 Y ACABADO ESMALTE RA-20 COLOR AZUL EN ESTRUCTURA METALICA.

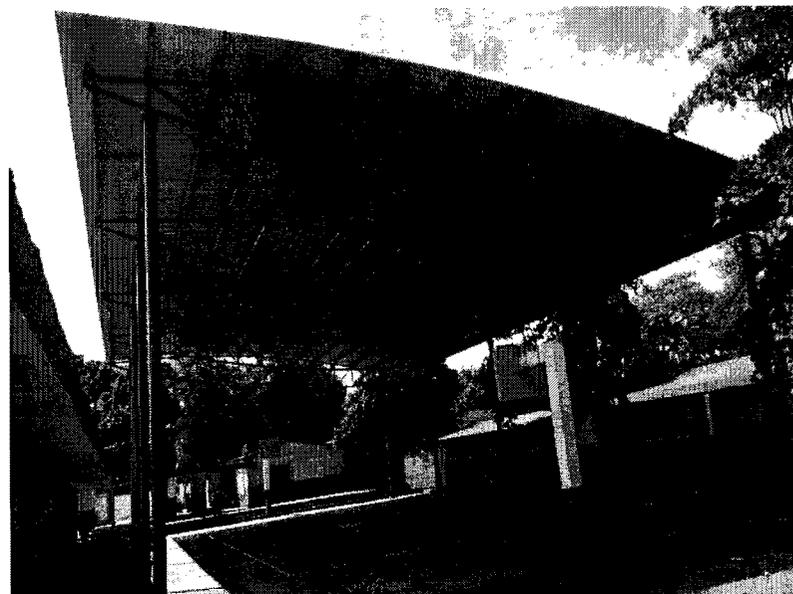

FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO,PREPARACION Y MONTAJE DE PERFILES ZINTRO GALVANIZADOS CANAL MONTEN DE 8" X 3" CAL.

12

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	MEDELLÍN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050016.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE :30DTV 0194U EN LA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PTR DE 3 X 1/2" CAL. 14 PARA SUJECION DE VIGA DE MONTENES.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TIPO R-101 GALVANIZADA PINTADA EN COLOR BLANCA CAL 24

Observaciones:

Empty rectangular box for recording observations.

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES

~~SUPERVISOR~~

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:
20/11/2017
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO		LOCALIDAD: MEDELLIN		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE :30DTV 0194U EN LA CABECERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2017301050016		

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			CLAVE AGEB: N/A			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X			SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD 19.059690000		LONGITUD -96.155010000									
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	X	NO					

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TECHADO PARA LA INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO DE 100% TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			424	\$429,532.34	\$128,859.70	\$1,851.43	\$0.00		\$298,821.21
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$429,532.34	\$128,859.70	\$1,851.43	\$0.00		\$298,821.21

MONTO AUTORIZADO:	\$429,532.34	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$435,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$300,672.64	28/08/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$429,532.34	31/08/2017
FINIQUITO:	\$429,532.00	10/07/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/07/2017

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	7	80	13	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	7	80	13	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-003/2017	FECHA:	25/05/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$429,532.34	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	26/05/2017	26/05/2017
	TÉRMINO	10/07/2017	10/07/2017
	DÍAS	46	46
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO:	\$128,859.70	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		16/06/2017

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$128,859.70	\$42,953.23	\$42,953.23
AFIANZADORA:	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A.
No. DE FIANZA:	2098644	2098646	2113426
FECHA:	25/05/2017	25/05/2017	10/07/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:	\$429,532.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORRAZA PANI REYES
 DIRECTOR DE OBRAS

ING URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES


Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	MEDELLÍN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050021.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CON CLAVE: 30EPR3159I EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

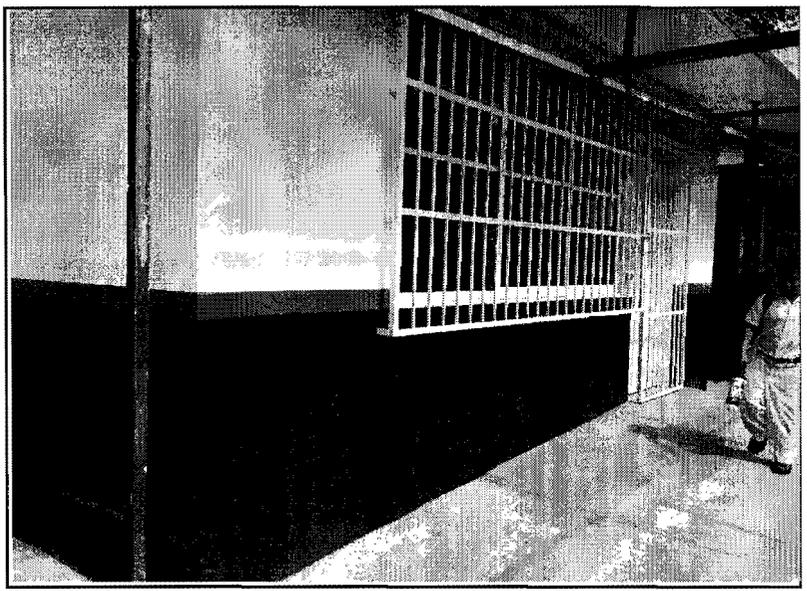

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. Y PROTECCIONES DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS.

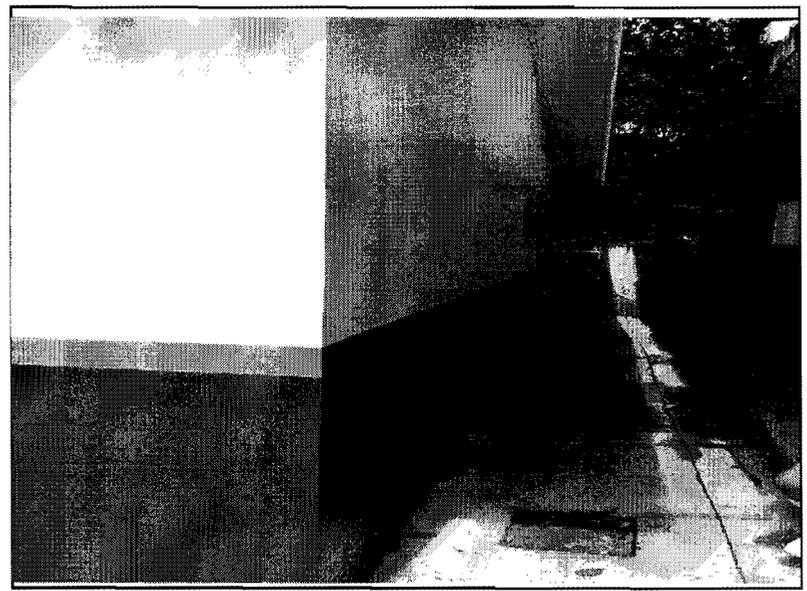


FOTO

Concepto de obra ejecutado:

APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

Observaciones:



 ING. ANGEL URIEL HERNÁNDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA****DATOS GENERALES**

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	EL TEJAR	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050022.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 30EJN0144W, EN LA			Fuente de financiamiento:	MUCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

**FOTO**

TUVO DE PVC DE 4 " PARA DESCARGA PLUVIAL

Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA TIPO R-101
GALVANIZADAConcepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	EL TEJAR	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050023.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 PARCIAL
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE: 30EPR1361H EN EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE			Fuente de financiamiento:	MUCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

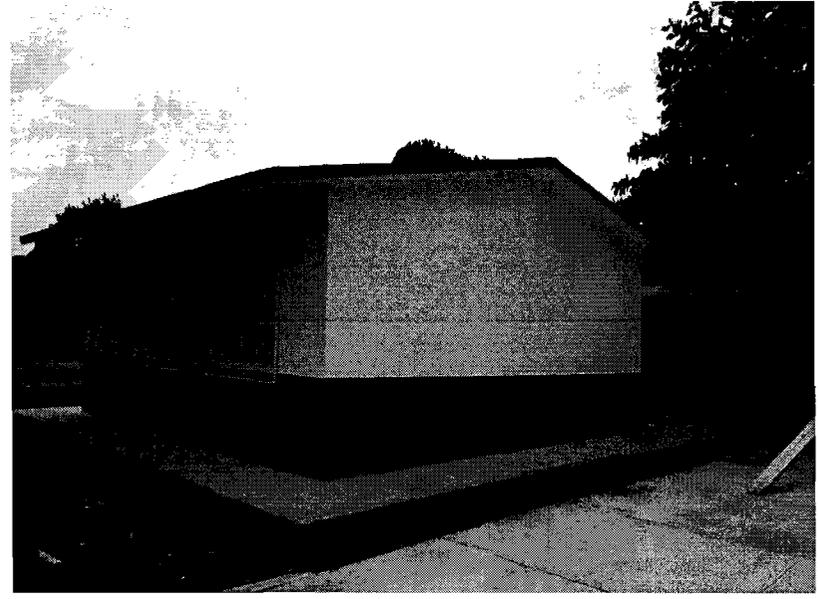

FOTO

Concepto de obra ejecutado: APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADOS DE 1/2" A CADA 12 CMS.

Observaciones:



 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:
20/11/2017
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO		LOCALIDAD: EL TEJAR	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE: 30EPR1361H EN EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES		No. DE OBRA: 2017301050023	

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO			GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	CLAVE AGE: 0183	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO			DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	X
LATITUD 19.026734	LONGITUD -96.135381		PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		NO	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
COMEDOR - ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
IMACION 1 PARC	\$0.00			481	\$400,534.83	\$120,160.45	\$1,726.44	\$0.00		\$278,647.94
TOTALES			\$0.00		\$400,534.83	\$120,160.45	\$1,726.44	\$0.00		\$278,647.94

MONTO AUTORIZADO:	\$587,206.78	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$178,162.03	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-020/03	FECHA:	01/08/2017
CONTRATISTA:	PLANOS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$587,206.78		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	02/08/2017	02/08/2017
	DÍAS	20/10/2017	20/10/2017
	DÍAS	80	80
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$176,162.03	PORCENTAJE: 30.00	
	FECHA DE PAGO:	16/08/2017	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$280,374.38	02/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$456,536.41	31/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/10/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	50	30	20	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	50	30	20	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$127,306.00	\$42,435.00	\$58,720.67
AFIANZADORA:	SOFIMEX S.A	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A
No. DE FIANZA:	2112687	2112689	1851631
FECHA:	21/07/2017	21/07/2017	20/10/2017
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$587,206.78		C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	MEDELLÍN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050024.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDADES VARIAS (MEDELLIN, LOS ROBLES, EL TEJAR Y PASO DEL TORO) DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO,			Fuente de financiamiento:	MUCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	23/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: COLOCACION DE CIMBRA COMUN PARA HECHURA DE LOSA DE CONCRETO

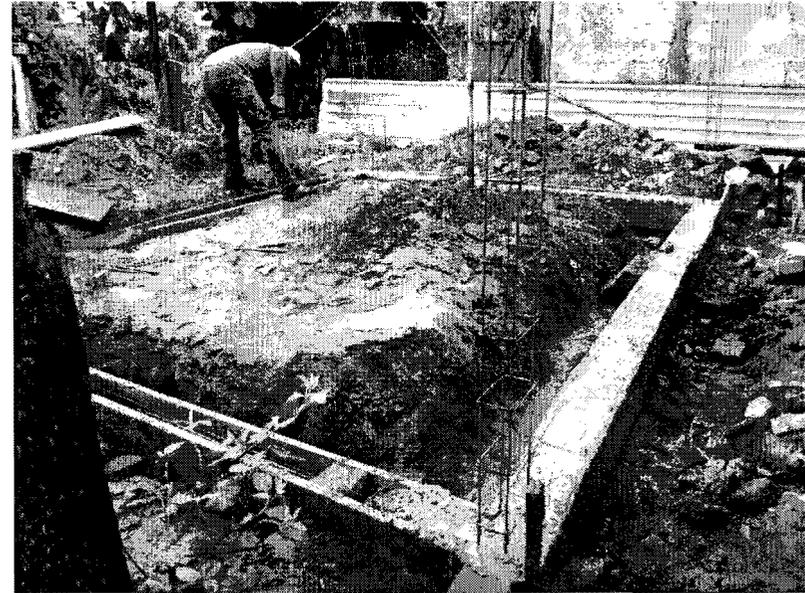

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TRABE DE CIMENTACION DE CONCRETO DE FC= 250 KG/CM2

Observaciones:

Empty rectangular box for recording observations.

ING. ANGEL UTEH HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	PASO DEL TORO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050025.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA XICOTENCATL, CON CLAVE 30EPR3630Z, EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN DE			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: TAPA O BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE ABSORCION CONFILTROS DE GRAVA Y ARENA

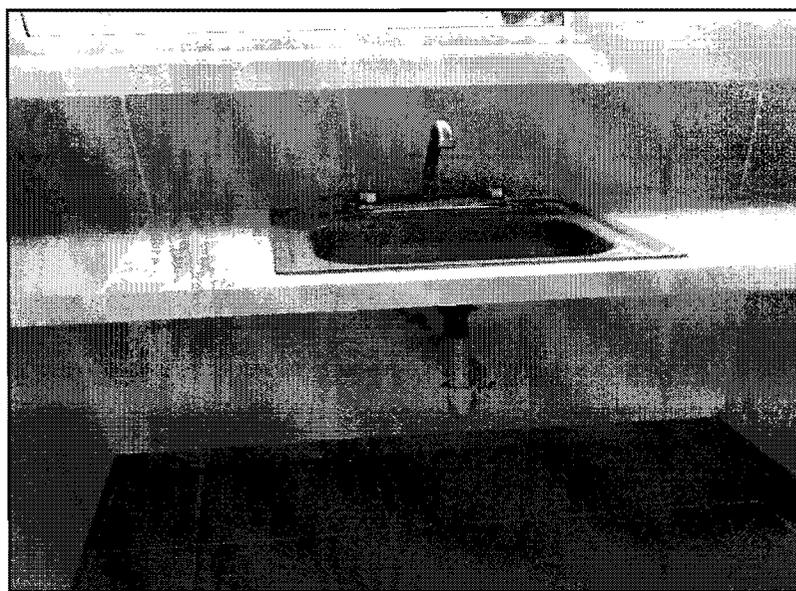

FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 85 CMS.INCLUYE LOS ACCESORIOS.

Observaciones:



 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	LOS ROBLES	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050026.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELSSA ARCELUS DE ZAPATA CON CLAVE: 30DJN0011G DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

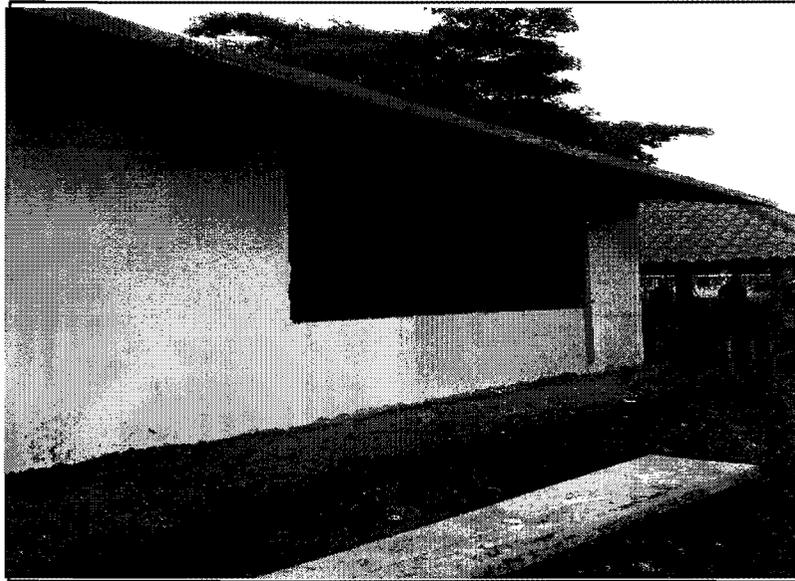

FOTO

Concepto de obra ejecutado: ALISADO CON PASTA -ADHESIVO SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON PEGAZULEJO MADISON O SIMILAR Y SELLADOR

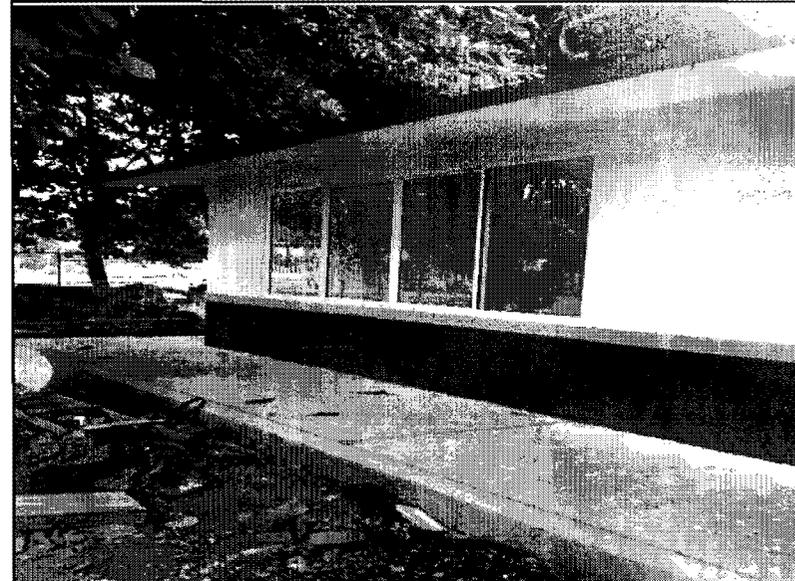

FOTO

Concepto de obra ejecutado: BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE SPESOR FC= 150KG/CM2. HECHO EN OBRA

Observaciones:

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	LAGUNA Y MONTE DEL CASTILI	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050027.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 PARCIAL
Descripción:	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE: 30DJN1568J DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA Y MONTE DEL			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017

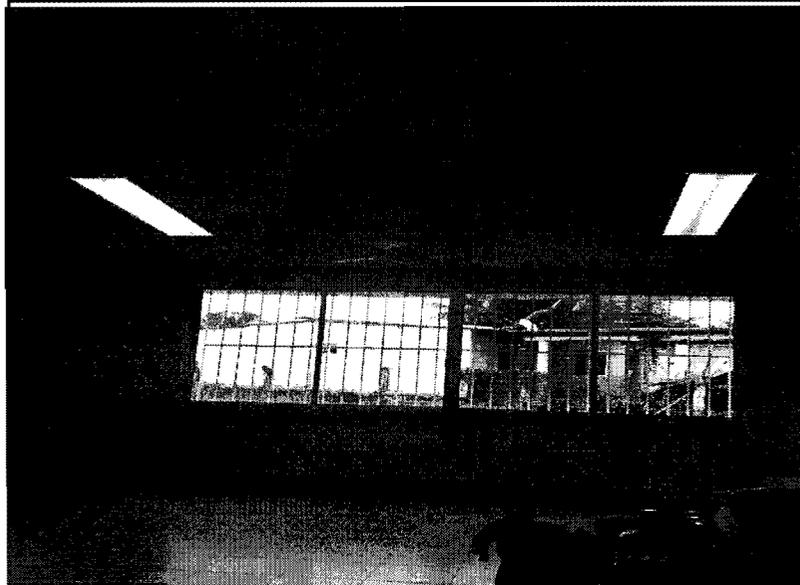

FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LEDS EN GABINETE DE 30 X 120 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA .



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL DE 6 MM. INCL. UN FIJO Y UN CORREDIZO.

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYEZ
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/11/2017
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO LOCALIDAD: LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NINOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE: 30DJN1568J DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA Y MONTE DEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2017301050027

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA

CLAVE AGEB: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 18.984167 LONGITUD -96.078056

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI X NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

COMEDOR - ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 1 PARC	\$0.00			387	\$249,930.03	\$124,965.03	\$1,077.28	\$0.00	\$123,887.72
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$249,930.03	\$124,965.03	\$1,077.28	\$0.00	\$123,887.72

MONTO AUTORIZADO: \$498,163.46 C/I

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$500,000.00 C/I

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: MMB-DDUOP-FISMDF-013/2017 FECHA: 18/07/2017

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL DIAZ ROCHA

MONTO CONTRATADO: \$498,163.46 C/I

PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMADA REAL

INICIO: 19/07/2017 19/07/2017

TÉRMINO: 26/09/2017 26/09/2017

DÍAS: 70 70

APLICA X NO APLICA

ANTICIPO: MONTO: \$249,081.73 PORCENTAJE: 50.00%

FECHA DE PAGO: 26/07/2017

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$124,965.00	13/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$374,046.73	31/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	05/10/2017

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	15	42	43	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	15	42	43	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTO

MONTO AFIANZADO: \$249,081.73 \$49,816.35

AFIANZADORA: FIANZAS ASECAM FIANZAS ASECAM

No. de FIANZA: VERO24-002108 VERO24-002107 VERO24-002117

FECHA: 18/07/2017 18/07/2017 26/09/2017

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$498,163.46 C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFRÉN CORNAZZANI REYES DIRECTOR DE OBRAS

ING. ÁNGEL URIEL HERNÁNDEZ REY SUPERVISOR




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** MOZAMBIQUE
No. de obra: 2017301050028.00 **Periodo:** OCTUBRE
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE: 30DJN2637W EN LA LOCALIDAD DE MOZAMBIQUE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
Número de estimación: ESTIMACION 1 PARCIAL
Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 22/11/2017

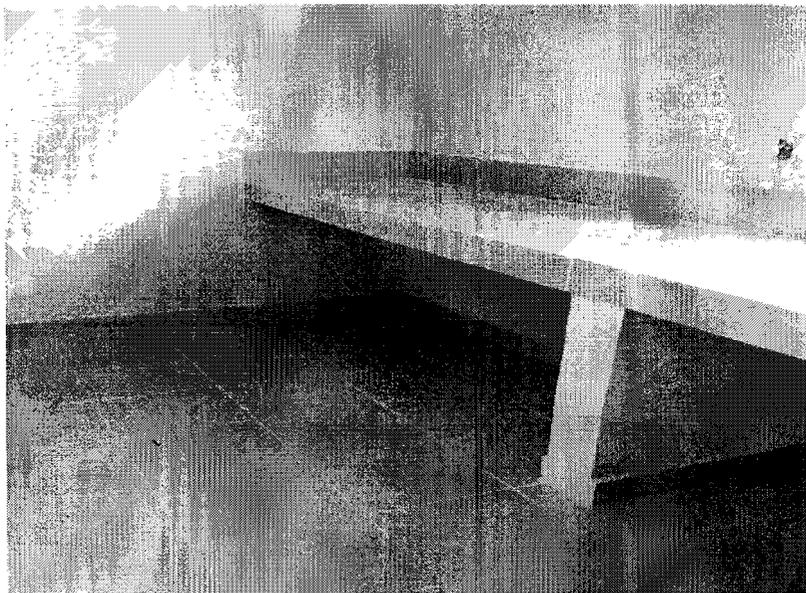

FOTO

Concepto de obra ejecutado: FABRICACION DE BARRA DE CONCRETO DE 3.80 X 0.60 MT. FORRADA DE AZULEJO ;

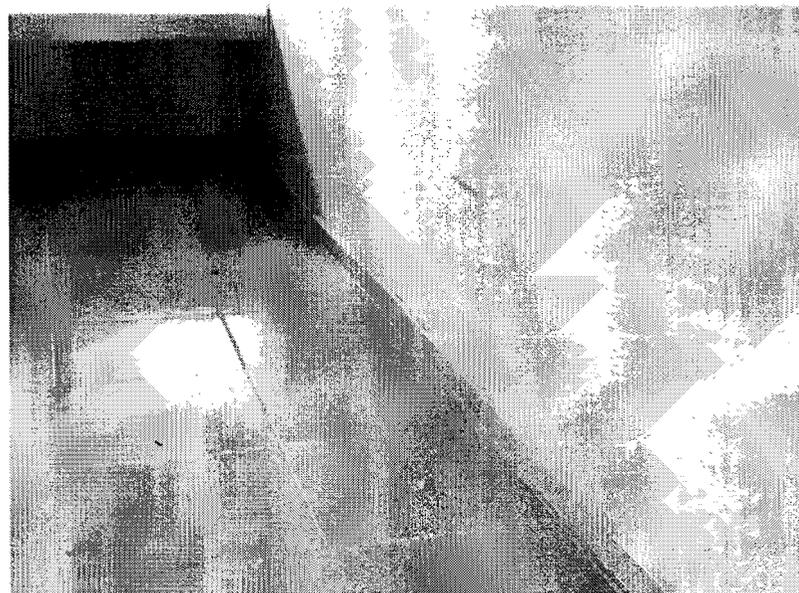

FOTO

Concepto de obra ejecutado: COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE INTERCERAMIC DE 33 X 33 CMS. INCLUYE ZOCLO DE 7.0 CMS.

Observaciones:

 ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	21/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: MOZAMBIQUE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE: 30DJN2637W EN LA LOCALIDAD DE MOZAMBIQUE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2017301050028	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:	PROYECTO ESPECIAL: SI X NO
LATITUD: 19.05898	LONGITUD: -96.254167
	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
COMEDOR - ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE DE 98 % ACABADOS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 1 PAR	\$0.00			390	\$229,777.29	\$114,888.65	\$990.42	\$0.00	\$113,898.22
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$229,777.29	\$114,888.65	\$990.42	\$0.00	\$113,898.22

MONTO AUTORIZADO:	\$497,028.76	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	X
	licitación pública <input type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-016/2017	FECHA:	22/07/2017
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL DIAZ ROCHA		
MONTO CONTRATADO:	\$497,028.76		C/IVA
	PROGRAMADA		REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 24/07/2017		24/07/2017
	TÉRMINO 02/10/2017		02/10/2017
	DÍAS 71		71
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA <input type="checkbox"/>		
	MONTO: \$248,514.38		PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO: 26/07/2017		

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$114,888.64	FECHAS 02/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$363,403.02	31/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	09/10/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	10	40	48	2	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	10	40	48	2	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$248,514.38	\$49,702.88	\$49,702.00
AFIANZADORA:	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM
No. DE FIANZA:	VER024-002110	VER024-002109	VER024-002178
FECHA:	22/07/2017	22/07/2017	02/10/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$497,028.76		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ÁNGEL JORGE HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** RANCHO DEL PADRE **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050029.00 **Periodo:** OCTUBRE **Número de estimación:**
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CÁNDIDO AGUILAR, CON CLAVE: 30DJN2686, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE DEL MUNICIPIO DE **Fuente de financiamiento:** SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES Y EXTRIORES.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: LOSA PLANA A DOS AGUAS EN AZOTEA , PERALTE DE 10 CMS DE ESPESOR,

Observaciones:

Empty rectangular box for observations.

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES
 SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	PRIMERO DE LA PALMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050030.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA HEROICA VERACRUZ, CON CLAVE: 30DTV1707J, EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE LA PALMA DEL MUNICIPIO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	22/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: FABRICACION DE BARRA DE CONCRETO DE 2.85 MT. DE LONGITUD Y 0.60 MT. DE ANCHO FORRADA DE AZULEJO, INC. FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.85 Y ACCESORIOS

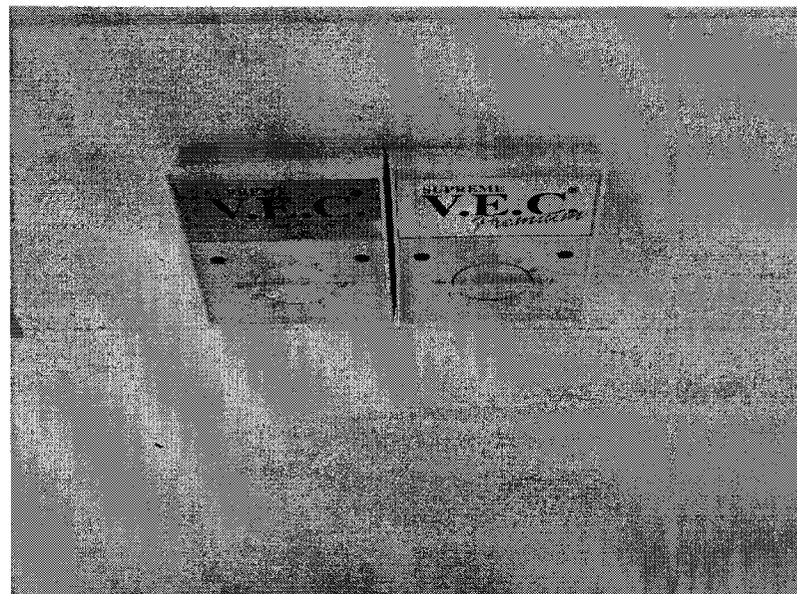

FOTO

Concepto de obra ejecutado: COLOCACION DE 2 VENTILADORES DE TECHO MARCA VEC DE 5 VELOCIDADES

Observaciones:

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** LOMAS DEL PORVENIR
No. de obra: 2017301050031.00 **Periodo:** OCTUBRE
Descripción: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA EMILINO ZAPATA, CON CLAVE: 30EPR1366C, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
Número de estimación: ESTIMACION 1 PARCIAL
Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 22/11/2017

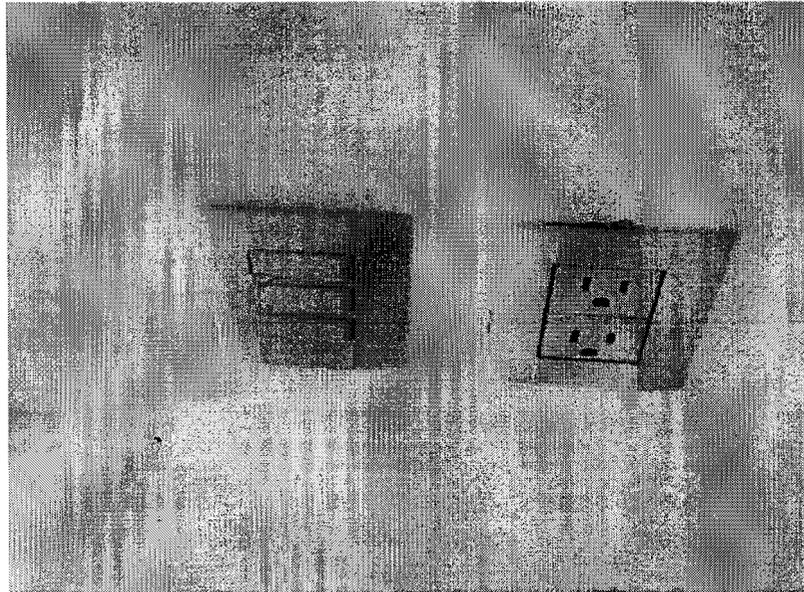

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR FC= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	20/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: LOMAS DEL PORVENIR	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA EMILINO ZAPATA, CON CLAVE: 30EPR1366C, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2017301050031	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO
CLAVE AGE: N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LATITUD: 19.05969	LONGITUD: -96.155007

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
COMEDOR ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA Y OPERANDO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IMACION 1 PAR	\$0.00			392	\$240,137.47	\$120,068.73	\$1,035.08	\$0.00	\$119,033.66
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$240,137.47	\$120,068.73	\$1,035.08	\$0.00	\$119,033.66

MONTO AUTORIZADO:	\$479,923.95	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$480,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	X
	licitación pública <input type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MMB-DDUOP-FISMDF-019/2017	FECHA:	27/07/2017
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL DIAZ ROCHA		
MONTO CONTRATADO:	\$479,923.95		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	PROGRAMADA	REAL
		28/07/2017	28/07/2017
	TÉRMINO:	05/10/2017	05/10/2017
	DÍAS:	70	70
ANTICIPO:	APLICA:	X	NO APLICA
	MONTO:	\$239,961.97	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:		11/08/2017

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$120,068.74	12/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$360,030.71	31/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	12/10/2017

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	55	40	5	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	55	40	5	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$239,961.97	\$47,992.40	\$47,992.00
AFIANZADORA:	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM	FIANZAS ASECAM
No. DE FIANZA:	VER024-002112	VER024-002113	VER024002179
FECHA:	27/07/2017	27/07/2017	05/10/2017
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$479,923.95		C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL VARELA HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR



FORTAMUNDF OCTUBRE 2017



Medellín Por El En Acción

Nicolás Bravo No. 60 C.P. 94270 Col. Centro Tel: 01 (285) 956 50 00
medellinenaccion@hotmail.com
R.F.C. MMB640114 IE6



@Medellin2014



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2017/MEDELLÍN DE BRAVO/27645

C. LUIS GERARDO PEREZ PEREZ
MEDELLÍN DE BRAVO
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/11/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	Santos Vega Romero
Observaciones:	

Cadena original:


jihdluqh3fffJZV1t9b+WHweyxSRfCIHySYlajtdLk1g7cfvVwFJV7wp+PUseCF6YZWUZdZLfdtcgDB4/
tLncqqIvK9GBj9OnVLveC6OphA90R+vbNH0+wsT7RQQbCKxi3R/
ZM17ZRwz4ZNxnvGryWyksqyuGhsM79ryeBWJ3tM=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA****DATOS GENERALES**

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** PLAYA DE VACAS
No. de obra: 2017301050216.00 **Periodo:** OCTUBRE
Descripción: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE VACA

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
Número de estimación: ESTIMACION 1 PARCIAL
Fuente de financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Fecha de revisión: 23/11/2017

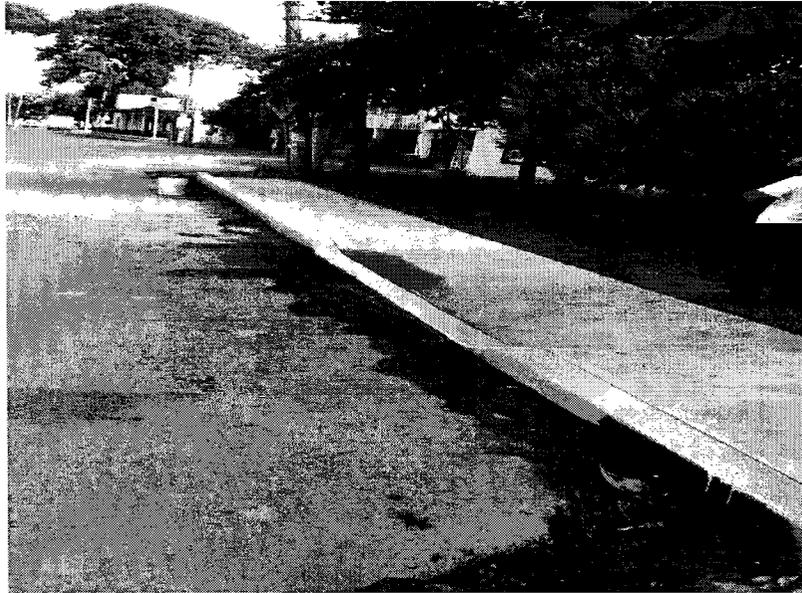**FOTO**

Concepto de obra
ejecutado:

GUARNICION SECCION 15X20X40 CM DE CONCRETO
HIDRAULICO F"C=150 KG/CM2, BANQUETA ACABADO
ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR.

Concepto de
obra ejecutado:

**FOTO**

APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN
GUARNICIONES

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

~~SUPERVISOR~~

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/2017
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: PLAYA DE VACAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2017301050216
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE VACA	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
CLAVE AGE: N/A	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 0.000000000	LONGITUD: 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE DE 100%, OBRA TERMINADA

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
MACION 1 PARC	\$0.00			437	\$434,833.78	#####	\$1,874.28	\$0.00	\$215,542.60
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$434,833.78	#####	\$1,874.28	\$0.00	\$215,542.60

MONTO AUTORIZADO:	\$529,885.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$530,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$215,542.60	FECHAS 13/09/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$482,359.80	31/10/2017
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	07/06/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	AMB-DDUOP-FORTAMUNDF-003/201	FECHA:	27/04/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$529,885.85		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	PROGRAMADA 28/04/2017	REAL 28/04/2017
	TÉRMINO:	29/05/2017	29/06/2017
	DÍAS:	32	32
	APLICA:	X NO APLICA	
ANTICIPO:	MONTO: \$264,942.92	PORCENTAJE: 50.00	
	FECHA DE PAGO:	22/05/2017	

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$264,942.92	\$52,988.58	\$52,988.00
AFIANZADORA:	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX SA.	SOFIMEX S.A.
No. DE FIANZA:	2090216	2090219	2108417
FECHA:	27/04/2017	27/04/2017	29/05/2017
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO <input type="checkbox"/>	INICIAL	FINAL
	PLAZO <input type="checkbox"/>		
	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$529,885.85		C/IVA


*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN COBARRAZANI REYES ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
 DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA****DATOS GENERALES**

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** EL TEJAR
No. de obra: 2017301050217.00 **Periodo:** OCTUBRE
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CAMINO EL TEJAR AL FRACC. ARBOLEDAS SAN MIGUEL HACIA LA ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA EN LA LOC. EL

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
Número de estimación: ESTIMACION 2 Y FINIQUITC
Fuente de financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Fecha de revisión: 23/11/2017

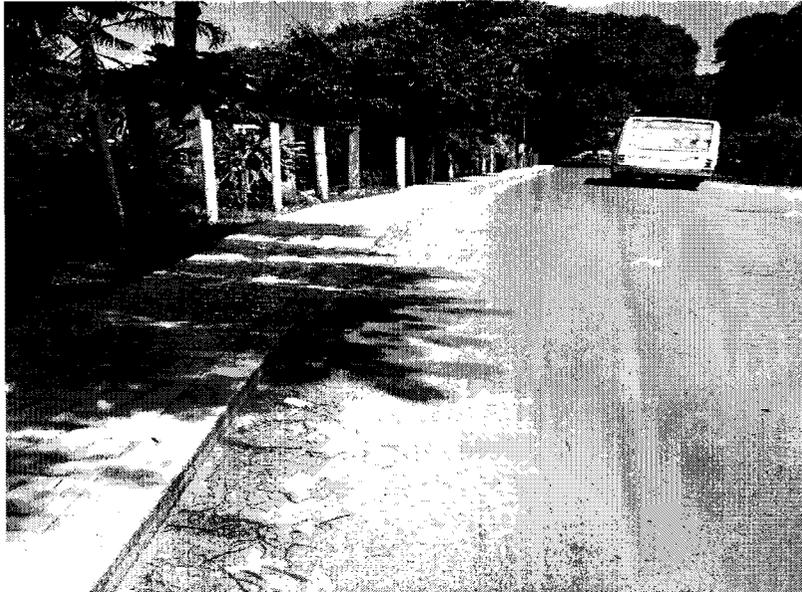**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICION Y BORDILLO

Concepto de obra ejecutado:

**FOTO**

LIMPIEZA DE OBRA GRUESA.

Observaciones:

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	20/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: EL TEJAR	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CAMINO EL TEJAR AL FRACC. ARBOLEDAS SAN MIGUEL HACIA LA ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA EN LA LOC. EL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050217	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE AGEB: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 0.00000000	LONGITUD 0.00000000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRABAJOS AL 100%, OBRA TERMINADA

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACION 2 Y FINIC	\$0.00			A34	\$44,899.81	\$22,449.91	\$193.53	\$0.00	\$22,256.37
IMACION 1 PARC	\$0.00			A32	\$623,402.15	\$311,701.07	\$2,687.08	\$0.00	\$309,014.00
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$668,301.96	\$334,150.98	\$2,880.61	\$0.00	\$331,270.37

MONTO AUTORIZADO:	\$668,301.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$670,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	IMB-DDUOP-FORTAMUNDF-002/2017	FECHA:	26/04/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GUTIERREZ ALONSO S.A. DE CV		
MONTO CONTRATADO:	\$668,301.96	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	27/04/2017	27/04/2017
	DÍAS	23/05/2017	23/05/2017
	APLICA	27	27
ANTICIPO:	MONTO: \$334,150.98	NO APLICA <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	03/05/2017	

REPORTES		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$22,256.37	22/08/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$668,301.00	29/09/2017
FINIQUITO:	\$668,301.00	29/09/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/05/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	5	95	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$334,150.98	\$66,830.19	\$66,830.19
AFIANZADORA:	FIANZAS MONTERREY	FIANZAS MONTERREY	FIANZAS MONTERREY
No. DE FIANZA:	1797851	1797853	1808754
FECHA:	24/04/2017	24/04/2017	23/05/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$668,301.00		C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ANGEL URIEL FERNANDEZ REYES
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES


Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** IONAMIEN TO ARBOLEDAS SAN F
No. de obra: 2017301050218.00 **Periodo:** OCTUBRE
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIA (SEGUNDA ETAPA) **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2017
Número de estimación: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Fuente de financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Fecha de revisión: 23/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

CONSTRUCCION DE CENTRAL DE EMERGENCIAS

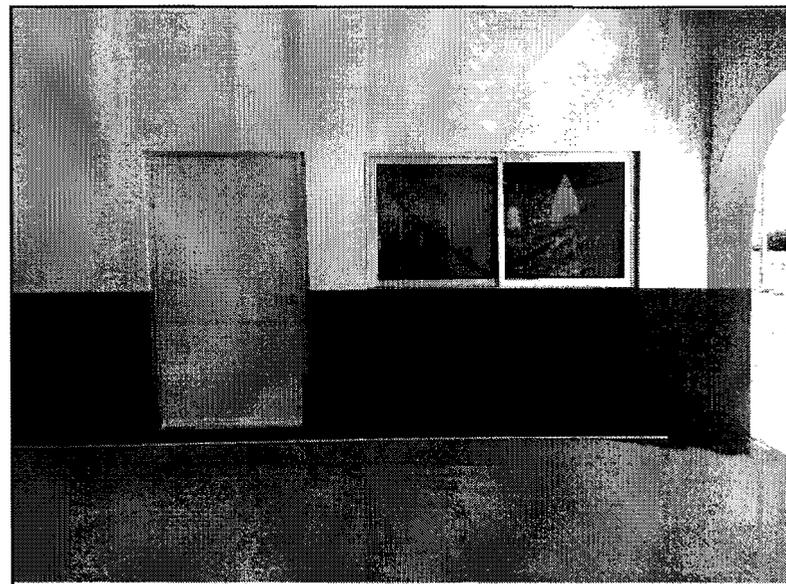

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL DE 0.90 X 2.20MT. EN COLOR ARENA , INCLUYE MARCO METALICO, FIJO DE

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION: 20/11/2017
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS SAN RAMON	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIA (SEGUNDA ETAPA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050218	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> X
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
LATITUD: 0.000000000	LONGITUD: 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRABAJOS AL 100%, OBRA TERMINADA

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			422	\$1,299,990.64	\$649,995.32	\$5,603.41	\$0.00	\$644,391.91
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$1,299,990.64	\$649,995.32	\$5,603.41	\$0.00	\$644,391.91

MONTO AUTORIZADO:	\$1,299,990.64	C/I
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,300,000.00	C/I
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$649,995.32	22/08/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,299,990.00	29/09/2017
FINIQUITO:	\$1,299,990.00	29/09/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/05/2017

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

NO. DE CONTRATO: #MB-DDUOP-FORTAMUNDF-001/201	FECHA: 21/04/2017
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	
MONTO CONTRATADO: \$1,299,990.64	C/I
	PROGRAMADA REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 22/04/2017 22/05/2017
	TÉRMINO 22/05/2017 22/05/2017
	DÍAS 31 31
ANTICIPO:	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X NO APLICA <input type="checkbox"/>
	MONTO: \$649,995.32 PORCENTAJE: 50
	FECHA DE PAGO: 27/04/2017

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTO
MONTO AFIANZADO: \$649,995.32	\$129,999.06	\$129,999.06
AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A.
No. DE FIANZA: 2088879	2088883	2107558
FECHA: 21/04/2017	21/04/2017	04/07/2017
	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	INICIAL FINAL
	NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,299,990.00	C/IVA

DANTE EFREN CORNAZZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO **Localidad:** NTE DE NOVIEMBRE DE MEDELL
No. de obra: 2017301050220.00 **Periodo:** OCTUBRE **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2017
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE **Número de estimación:** ESTIMACION 1 FINIQUITO
Fuente de financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS **Fecha de revisión:** 23/11/2017

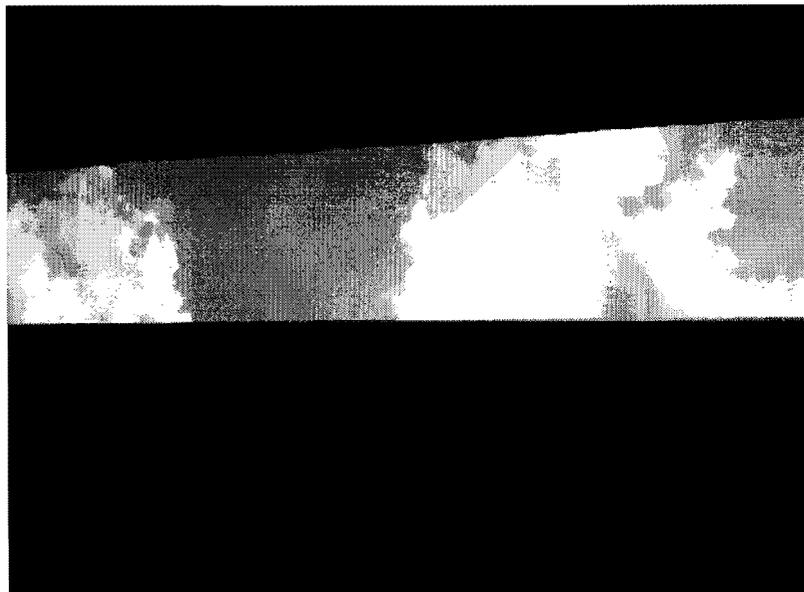

FOTO

Concepto de obra
ejecutado:CANALETA DE ALUMINIO GALVANIZADO PARA DREN
PLUVIAL

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TIPO R-101
GALVANIZADA.

Observaciones:

Empty box for observations.

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:
20/11/2017
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: NIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE MEDELLIN DE B	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MEDELLIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050220	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
CLAVE AGE: N/A	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECIAL: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 0.00000000	LONGITUD: 0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TECHADO PARA INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE DE 100%, OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			425	\$499,374.95	\$149,812.48	\$2,152.48	\$0.00	\$347,409.99
TOTALES	\$0.00	\$0.00			\$499,374.95	\$149,812.48	\$2,152.48	\$0.00	\$347,409.99

MONTO AUTORIZADO:	\$499,374.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$349,562.47	28/08/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$499,374.95	29/09/2017
FINIQUITO:	\$499,374.95	29/09/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	27/06/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	47	53	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	47	53	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	AMB-DDUOP-FORTAMUNDF-004/201	FECHA:	10/05/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$499,374.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	11/05/2017	11/05/2017
	DÍAS	23/06/2017	23/06/2017
	DÍAS	44	44
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
MONTO:	\$149,812.48	PORCENTAJE:	30.00
FECHA DE PAGO:			16/06/2017

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$149,812.48	\$49,937.49	\$49,937.49
AFIANZADORA:	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A.	SOFIMEX S.A.
No. DE FIANZA:	2092106	2092118	2113443
FECHA:	11/05/2017	11/05/2017	23/06/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO:	NO APLICA	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO CONTRATO) DE OBRA:	\$499,374.00		C/IVA

OBSERVACIONES:

DANTE EFREN CORNAZZANI REYES ING. URIEL HERNANDEZ REYES
 DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad:	DOS BOCAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2017
No. de obra:	2017301050221.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA EL TEJAR-VERACRUZ EN EL TRAMO ACCESO A DOS BOCAS-ACCESO			Fuente de financiamiento:	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
				Fecha de revisión:	23/11/2017



FOTO

Concepto de obra ejecutado: BANQUETAY GUARNICION DE CONCRETO DE FC" = 150 KG/CM2.



FOTO

Concepto de obra ejecutado: REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

Observaciones:

Empty box for observations

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION: 20/11/2017
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: DOS BOCAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA EL TEJAR-VERACRUZ EN EL TRAMO ACCESO A DOS BOCAS-ACCESO SORIANA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2017301050221	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
CLAVE AGE: N/A	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:	
LATITUD: 0.000000000	LONGITUD: 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS, TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			A38	\$240,047.28	\$0.00	\$1,034.69	\$0.00	\$239,012.59
TOTALES	\$0.00	\$0.00			\$240,047.28	\$0.00	\$1,034.69	\$0.00	\$239,012.59

MONTO AUTORIZADO:	\$240,047.28	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$250,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	
	LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	VMB-DDUOP-FORTAMUNDF-00/201	FECHA:	14/07/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCCTORA Y ARRENDADORA GUTIERREZ ALONSO		
MONTO CONTRATADO:	\$240,047.28		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	17/07/2017	17/07/2017
	TÉRMINO	31/07/2017	31/07/2017
	DÍAS	15	15
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	MONTO:		
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$240,047.28	22/08/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$240,047.28	22/08/2017
FINIQUITO:	\$240,047.28	22/08/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	03/08/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO:	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			\$24,004.72
AFIANZADORA:			FIANZAS MONTERREY
NO. DE FIANZA:			1822801
FECHA:			01/08/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO/CONTRATO) DE OBRA:		\$240,047.00	C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNAZZANI REYES ING. ANGEL URIEL FERNANDEZ REYES
 DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: MEDELLÍN DE BRAVO	Localidad: MEDELLÍN	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2017
No. de obra: 2017301050222.00	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
Descripción: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MEDELLIN DE BRAVO, VER.		Fecha de revisión: 23/11/2017
Fuente de financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS		



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE FESTER O SIMILAR



FOTO

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO PLÁSTICO PARA CALAFATEO

Observaciones:

ING. ANGEL URTEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/11/2017
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

MUNICIPIO: MEDELLIN DE BRAVO	LOCALIDAD: MEDELLIN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MEDELLIN DE BRAVO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2017301050222	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL: <input type="checkbox"/>
LATITUD: 0.00000000	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LONGITUD: 0.00000000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
OBRA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL, TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACION 1 Y FINIC	\$0.00			482	\$204,410.10	\$61,323.03	\$881.08	\$0.00	\$142,205.99
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$204,410.10	\$61,323.03	\$881.08	\$0.00	\$142,205.99

MONTO AUTORIZADO:	\$204,410.10	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$204,410.10	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	
	licitación pública <input type="checkbox"/>	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$143,087.07	11/10/2017
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$204,410.10	11/10/2017
FINIQUITO:	\$204,410.00	11/10/2017
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/08/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	IMB-DDUOP-FORTAMUNDF-005/201	FECHA:	14/07/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GUTIERREZ ALONSO		
MONTO CONTRATADO:	\$204,410.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/08/2017	01/08/2017
	TÉRMINO	15/08/2017	15/08/2017
	DÍAS	15	15
ANTICIPO:	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>		
	MONTO: \$61,323.03	PORCENTAJE: 30.00	
	FECHA DE PAGO:	16/08/2017	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$61,323.03	\$20,441.01	\$20,441.00
AFIANZADORA:	FIANZAS MONTERREY	FIANZAS MONTERREY	FIANZAS MONTERREY
No. DE FIANZA:	1824951	1824953	1834492
FECHA:	28/07/2017	28/07/2017	16/08/2017
	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$204,410.00		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DANTE EFREN CORNALZANI REYES
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL URIEL HERNANDEZ REYES
SUPERVISOR
